

平成24年8月25日(土)市政懇談会資料

留萌小学校改築計画について

留萌市教育委員会

◆当初計画から内容を変更

(理由)

学校施設の適正規模の見直し・補助金の再精査

◆見直し・変更した項目

- ①学校施設規模・・・学級数・屋内体育館面積など
- ②事業費・財源内訳・・・全体事業費・国の補助金など
- ③その他・・・沖見小学校の解体

◆学校・PTA・地域への説明

【留萌小PTA】6月5日、18日説明会開催

【沖見小PTA】6月6日、14日説明会開催・7月4日要望書提出・了承


【留萌小校区】7月20日：港西コミセン傘下町内会説明会

【沖見小校区】7月23日：港南コミセン傘下町内会説明会

◆学校施設規模の変更内容◆

【留萌小学校改築基本構想】

- 校舎面積: $4,500\text{m}^2 \sim 5,500\text{m}^2$ 程度
 - ・学 級 数: 普通学級12学級・特別支援学級5学級
 - ・所 要 室: 普通教室、特別室(理科室等)多目的室、多目的ホール、管理諸室
- 屋内体育館面積: $1,250\text{m}^2$ 程度
 - ・所 要 室: アリーナ、ステージ等



市内の1学年・2学級の小学校を参考に再精査


【変更後の学校規模】

- 校舎面積: $3,950\text{m}^2$
 - ・学 級 数: 普通学級12学級・特別支援学級4学級
 - ・所 要 室: 普通教室、特別室(理科室等)、多目的室、ことばの教室、管理諸室(校長室等)、その他(廊下、EV室等)
- 屋内体育館面積: 971m^2 程度
 - ・所 要 室: アリーナ、ステージ等

◆事業費と財源内訳の変更内容◆

【当初の計画】

区 分	金額(千円)
総事業費	2,209,085
国 費	1,213,845
地 方 債	943,400
そ の 他	—
一般財源	51,840
校 舎:4,360m ² 屋内体育館:1,258m ²	



- ・補助率の見直し
- ・地方債対象経費と適用率の見直し
- ・沖見小解体工事の見直し

【変更後の計画】

区 分	金額(千円)
総事業費	1,670,865
国 費	462,756
地 方 債	1,182,700
そ の 他	—
一般財源	25,409
校 舎:3,950m ² 屋内体育館: 971m ²	

◆今後のスケジュール◆

【平成24年度】

○平成24年7月19日：基本設計・実施設計委託業務契約

○平成24年10月末：基本設計取りまとめ（PTA等への説明は3回予定）

○平成25年3月15日：実施設計完成

○平成25年3月31日：沖見小学校の閉校

【平成25年度】

○平成25年4月1日：留萌小・沖見小統合＝留萌小学校

○平成25年6月末：建設工事着工


【平成26年度】

○平成26年11月末：「新校舎」完成＊引越時期はPTAと協議し決定

留萌小学校の基本理念

「生きる力」をはぐくみ、子どもたちの夢と可能性が育つ学校づくり

子どもたちの夢と可能性が育つ学校づくり

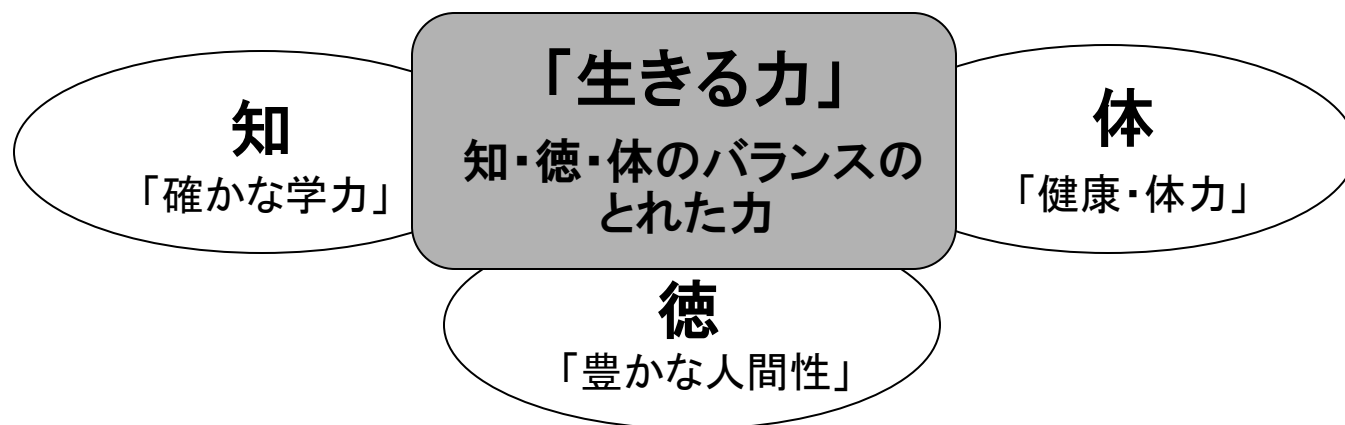

安全で安心して学べる学校施設
時代の変化に対応した魅力的かつ良質な教育環境
