


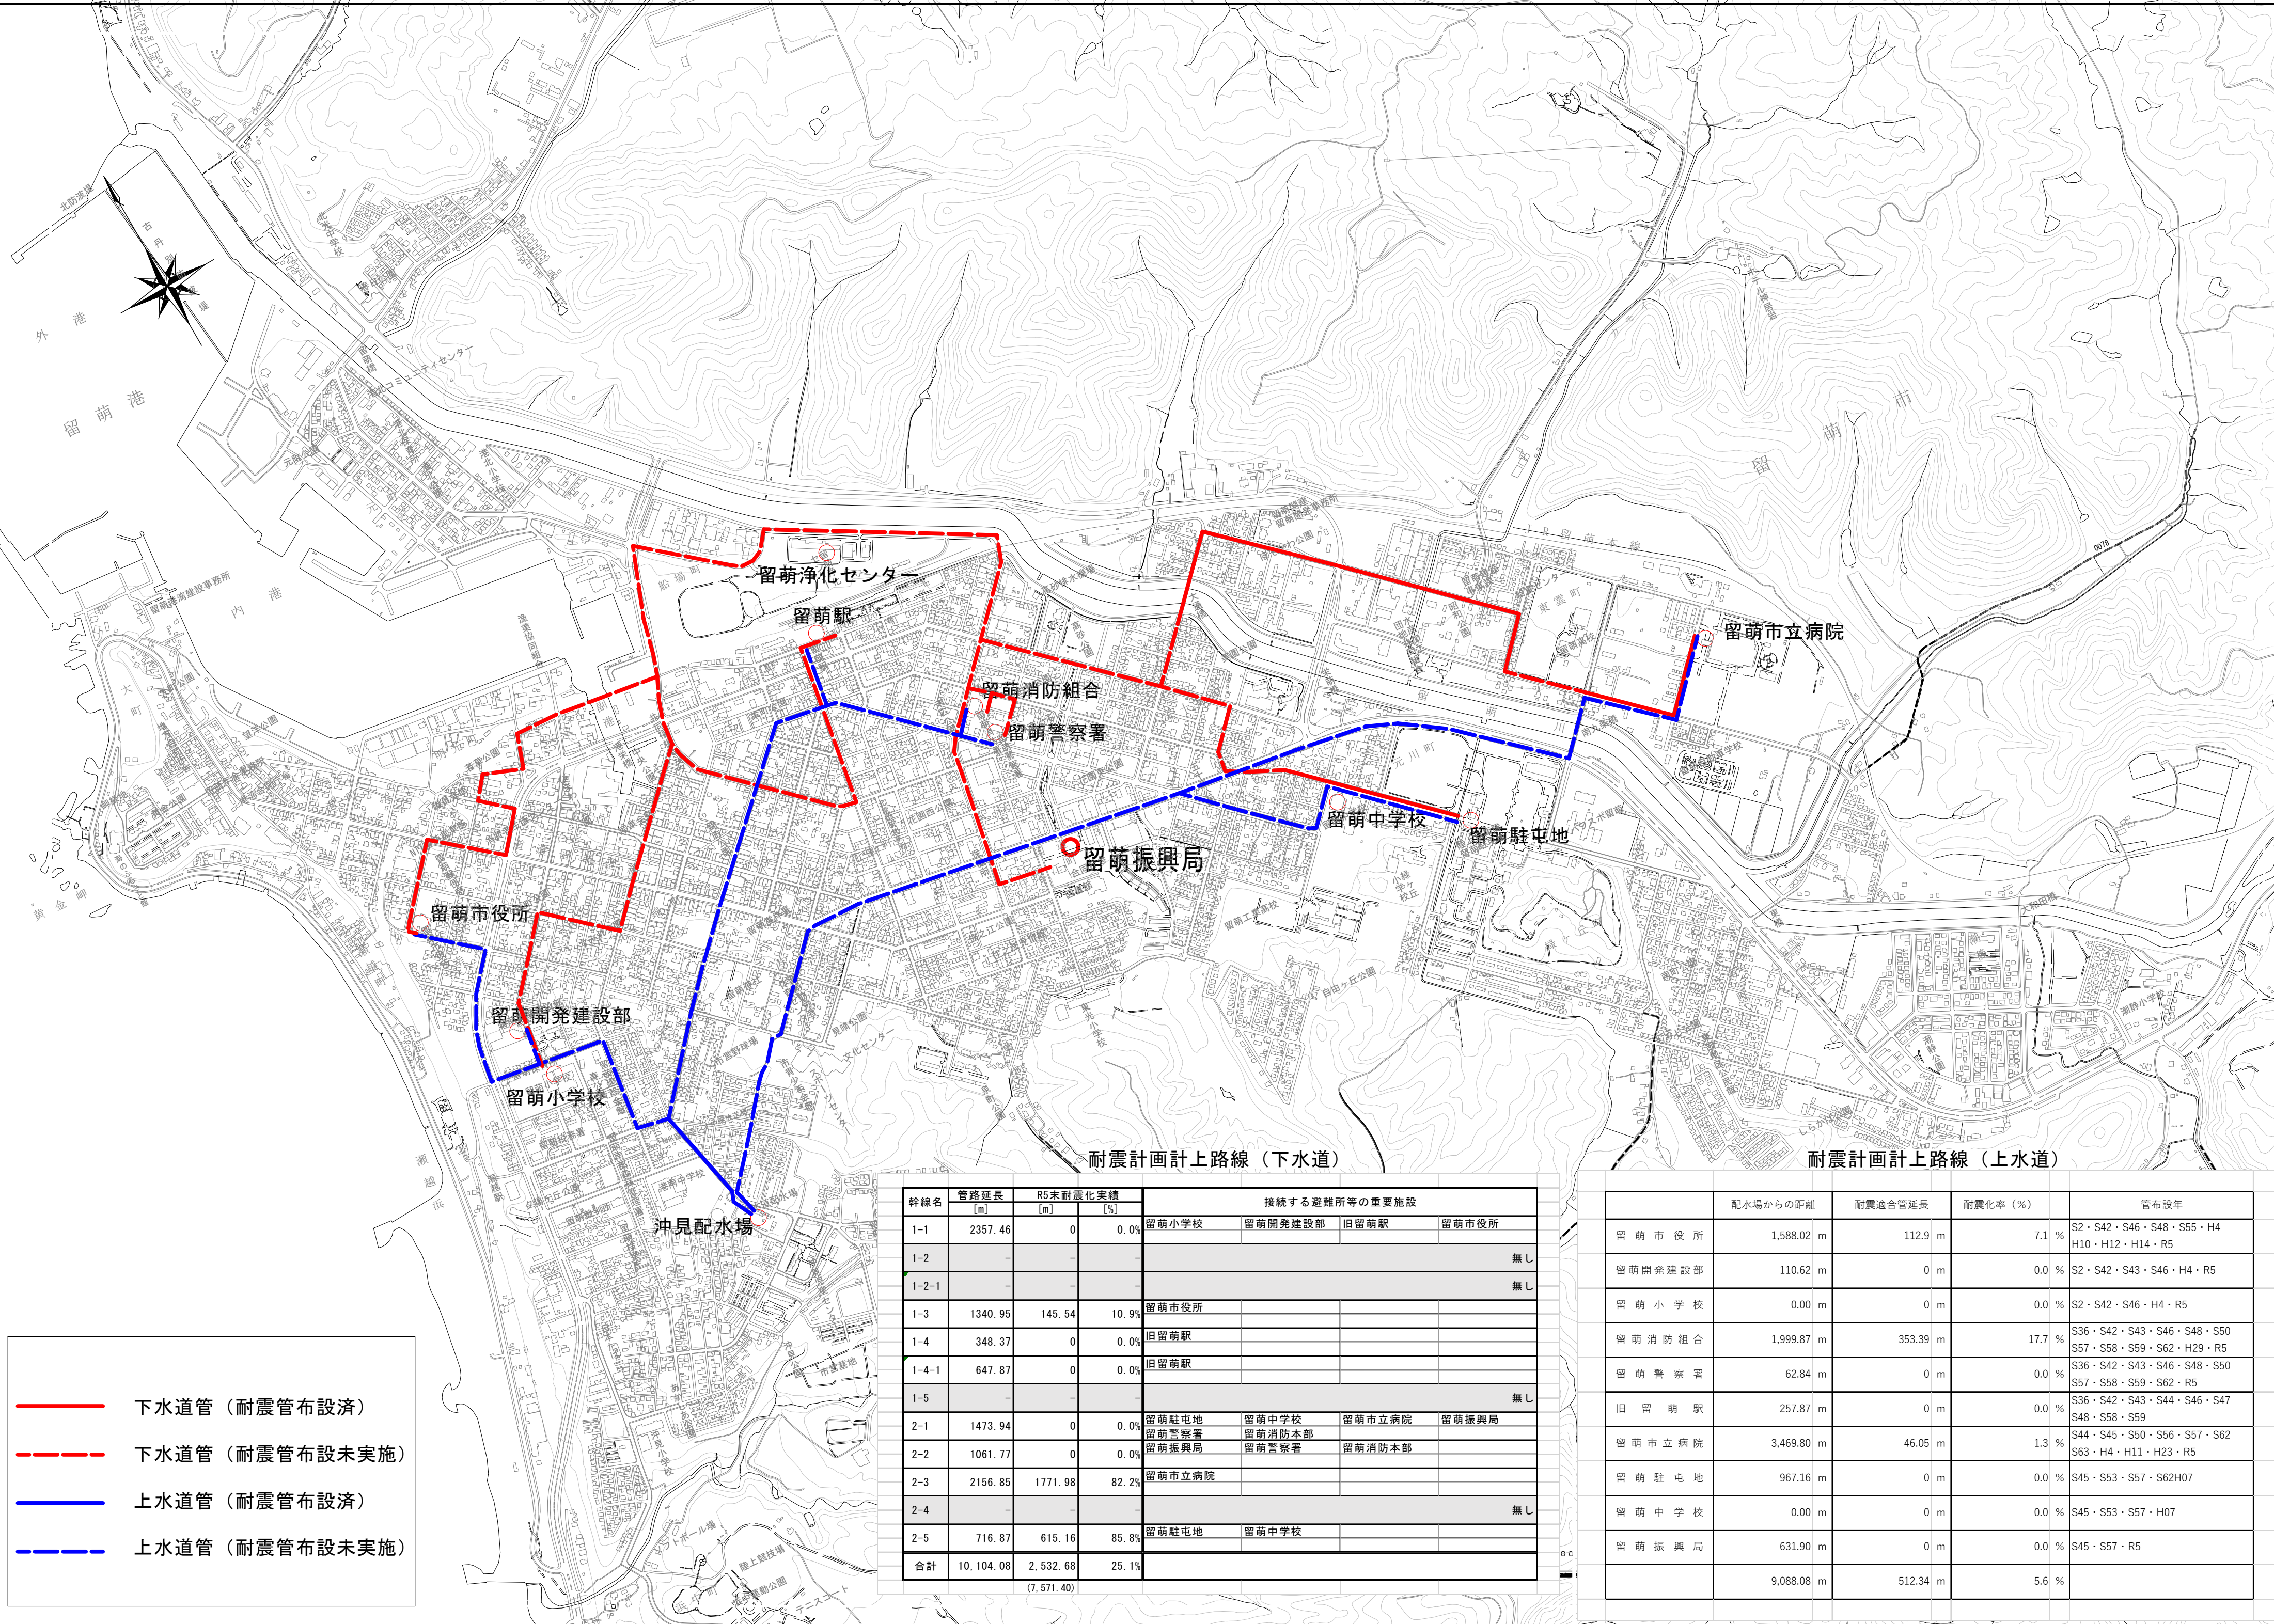

下水道管（耐震管布設済）

下水道管（耐震管布設未実施）

上水道管（耐震管布設済）

上水道管（耐震管布設未実施）

耐震計画計上路線（下水道）

幹線名	管路延長 [m]	R5末耐震化実績		接続する避難所等の重要施設
		[m]	[%]	
1-1	2357.46	0	0.0%	留萌小学校 留萌開発建設部 旧留萌駅 留萌市役所
1-2	-	-	-	無し
1-2-1	-	-	-	無し
1-3	1340.95	145.54	10.9%	留萌市役所
1-4	348.37	0	0.0%	旧留萌駅
1-4-1	647.87	0	0.0%	旧留萌駅
1-5	-	-	-	無し
2-1	1473.94	0	0.0%	留萌駐屯地 留萌中学校 留萌市立病院 留萌振興局
2-2	1061.77	0	0.0%	留萌警察署 留萌消防本部
2-3	2156.85	1771.98	82.2%	留萌市立病院
2-4	-	-	-	無し
2-5	716.87	615.16	85.8%	留萌駐屯地 留萌中学校
合計	10,104.08	2,532.68	25.1%	
		(7,571.40)		

耐震計画計上路線（上水道）

	配水場からの距離	耐震適合管延長	耐震化率（%）	管布設年
留 萌 市 役 所	1,588.02 m	112.9 m	7.1 %	S2・S42・S46・S48・S55・H4 H10・H12・H14・R5
留 萌 開 発 建 設 部	110.62 m	0 m	0.0 %	S2・S42・S43・S46・H4・R5
留 萌 小 学 校	0.00 m	0 m	0.0 %	S2・S42・S46・H4・R5
留 萌 消 防 組 合	1,999.87 m	353.39 m	17.7 %	S36・S42・S43・S46・S48・S50 S57・S58・S59・S62・H29・R5
留 萌 警 察 署	62.84 m	0 m	0.0 %	S36・S42・S43・S46・S48・S50 S57・S58・S59・S62・R5
旧 留 萌 駅	257.87 m	0 m	0.0 %	S36・S42・S43・S44・S46・S47 S48・S58・S59
留 萌 市 立 病 院	3,469.80 m	46.05 m	1.3 %	S44・S45・S50・S56・S57・S62 S63・H4・H11・H23・R5
留 萌 駐 屯 地	967.16 m	0 m	0.0 %	S45・S53・S57・S62H07
留 萌 中 学 校	0.00 m	0 m	0.0 %	S45・S53・S57・H07
留 萌 振 興 局	631.90 m	0 m	0.0 %	S45・S57・R5
	9,088.08 m	512.34 m	5.6 %	
